


# УПРАВЛЕНИЕ РАСПИСАНИЕМ ПРОЕКТА

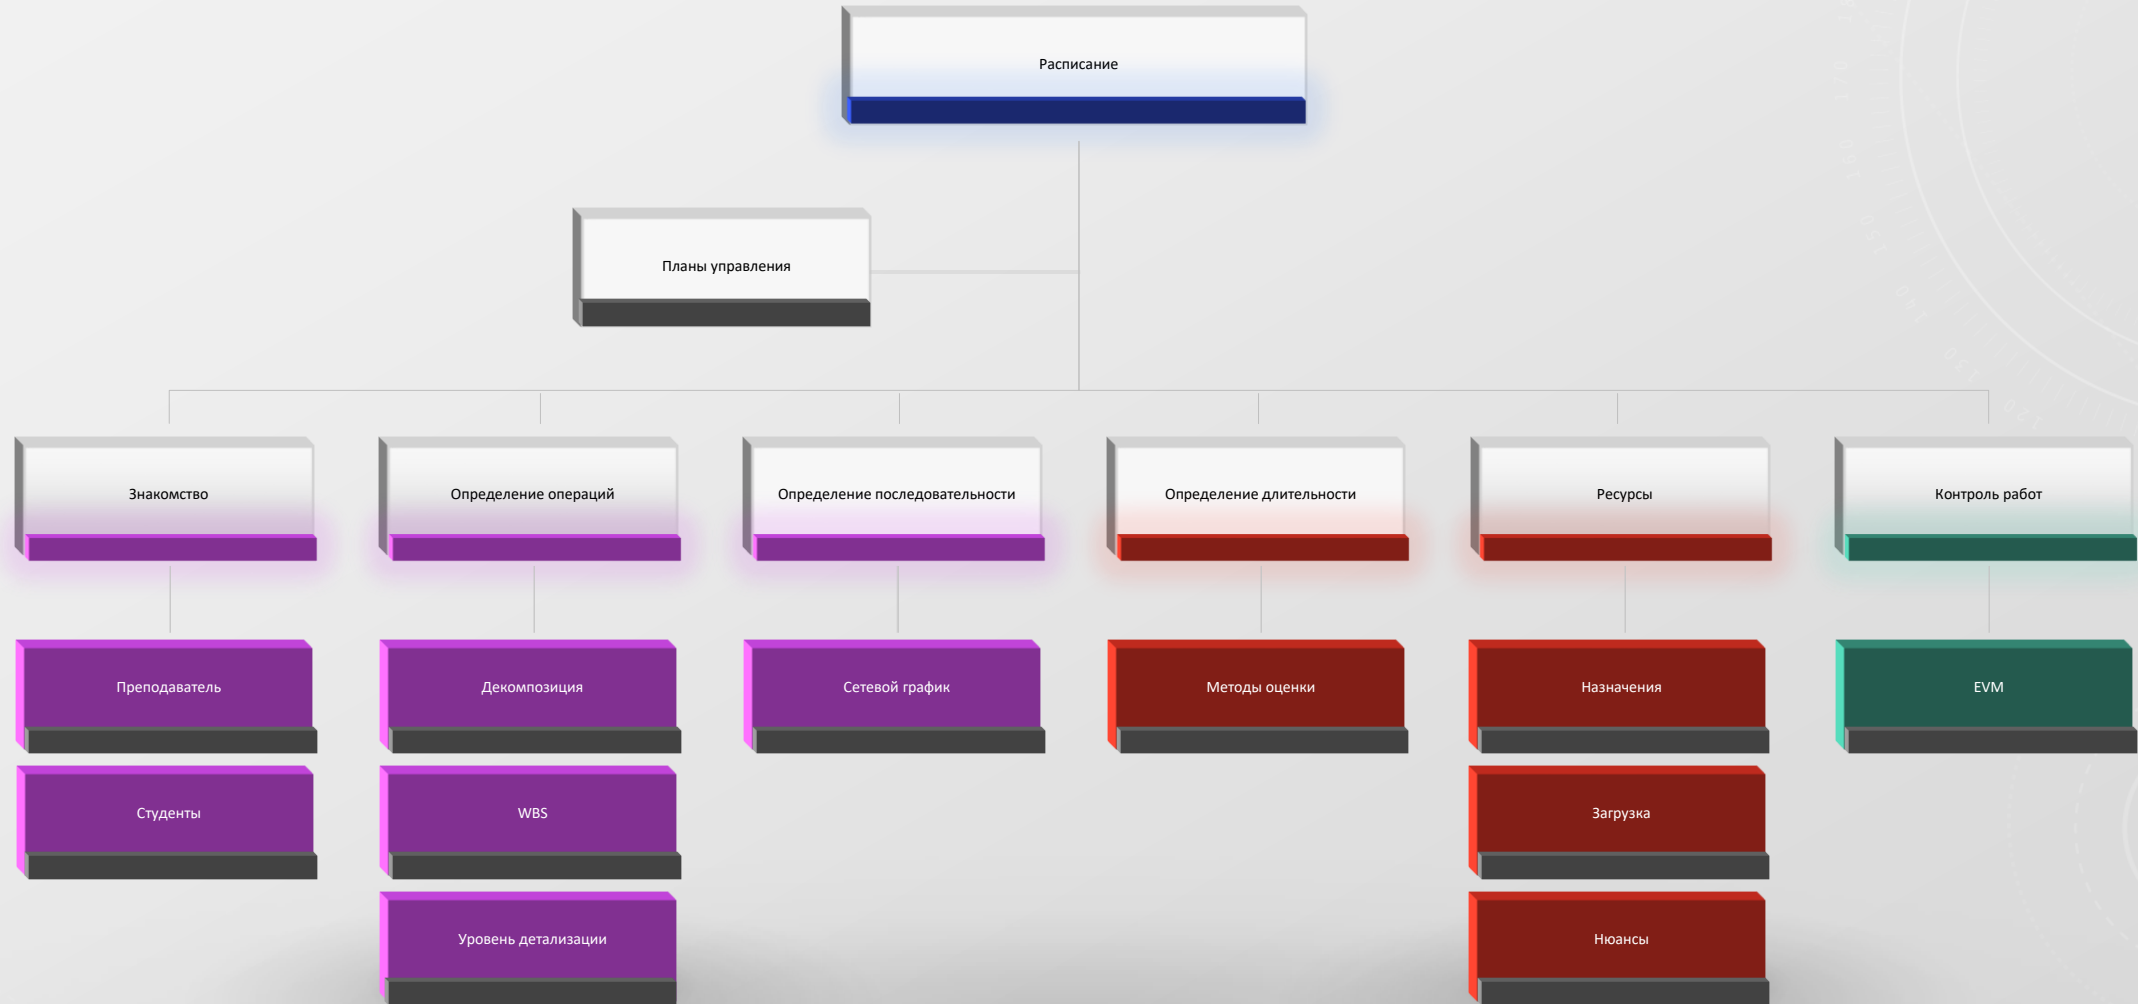

НАЧНЕМ ИЗ ДАЛЕКА

С плана управления расписанием 😊

# ПРОВЕРЯЕМ ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ ВМЕСТЕ

Задачи  
Связи  
Сроки



# ПОСМОТРЕЛИ?

Выполняем два простых действия:

1. Добавляем столбец «Последователи» (Последующие)

Все задачи должны иметь минимум 1 связь в предшественниках и 1 в последователях

Кроме суммарных задач

2. Меняем дату первой задачи проекта и смотрим как он «едет»

Весь план должен «сдвигаться»

Если какие-то задачи не уехали – план накосячен (или имеет ограничения, о которых мы должны знать)

# БОЛЕЕ СЛОЖНЫЕ ПРОВЕРКИ

Продолжаем простые действия

1. Добавляем столбец «Свободный резерв» (Slack, Slippage, Float)  
Если нет отрицательных – все более менее
2. Добавляем столбец «Общий резерв»  
Если нет отрицательных – все более менее



# ДРУГИЕ ПРОВЕРКИ

Минимум задержек  
Минимум сложных связей  
Минимум длинных задач

Кому очень любопытно, можно почитать DCMA 14 point assessment  
Кому нереально любопытно – можно посмотреть  
Scheduling Standard PMI, более 100 пунктов проверки плана

ЗАКОНЧИМ НА СЕГОДНЯ

Сохранить  
базовый  
план

И все только начинается...

Спасибо за внимание

И до новых встреч
